

Bauvorhaben:


Auftraggeber:

Bauteil/Stockwerk/Raum:

Installationsfirma:

Estrichleger:

Estricharbeiten beendet am:

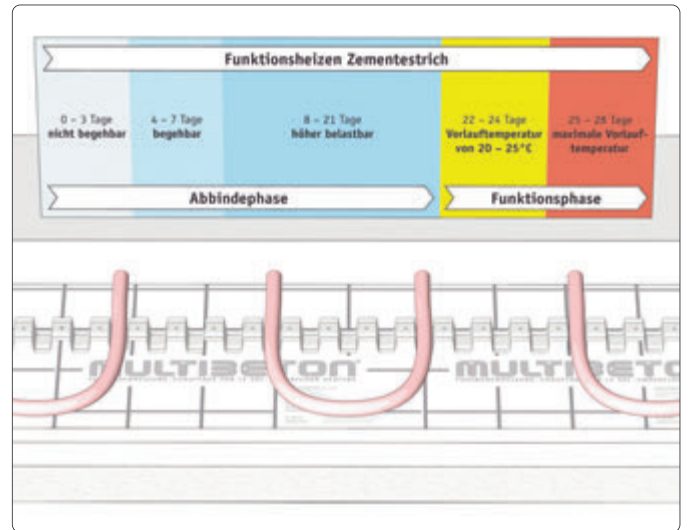

Beginn des Funktionsheizens mit 20 °C bis 25 °C Vorlauftemperatur am:

Beginn des Funktionsheizens mit maximal 55 °C Vorlauftemperatur am:

Ende des Funktionsheizens am:

Funktionsheizen unterbrochen? nein vom: bis:

War die beheizte Fußbodenfläche frei? ja nein

Waren die Räume zugfrei belüftet? ja nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am:

Bauherr/Auftraggeber:

Installationsfirma:

Bauleitung/Architekt:

Nach dem Funktionsheizen ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat. Unter Umständen ist ein Belegreifheizen notwendig.

Bauvorhaben:

Auftraggeber:

Bauteil/Stockwerk/Raum:

Installationsfirma:

Estrichleger:

Estricharbeiten beendet am:

Beginn des Funktionsheizens mit 20 °C bis 25 °C Vorlauftemperatur am:

Beginn des Funktionsheizens mit maximal 55 °C Vorlauftemperatur am:

Ende des Funktionsheizens am:

Funktionsheizten unterbrochen?

nein

vom:

bis:

War die beheizte Fußbodenfläche frei?

ja

nein

Waren die Räume zugfrei belüftet?

ja

nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von

°C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am:

Bauherr/Auftraggeber:

Installationsfirma:

Bauleitung/Architekt:

Nach dem Funktionsheizen ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat. Unter Umständen ist ein Belegreifheizen notwendig.

